

# 上尾市学校施設更新計画 実施計画（案）

令和 3 年 月  
上尾市教育委員会

# 目 次

第1章 計画の目的.....	- 1 -
1. 計画の目的 .....	- 1 -
2. 計画の期間 .....	- 1 -
3. 対象施設.....	- 1 -
4. 実施計画の管理 .....	- 1 -
5. 進捗状況の評価 .....	- 1 -
6. 成果の公表 .....	- 1 -
第2章 学校施設更新等実施行程表（アクションプラン） .....	- 2 -
1. アクションプランの分類・行程表 .....	- 2 -
(1) 新しい学校づくり優先検討エリア対象校 .....	- 2 -
(2) 建物更新校 .....	- 3 -
2. 各学校におけるアクションプラン .....	- 4 -
<b>【巻末資料】</b> .....	- 15 -
① 既存学校施設の目標耐用年数	
② 学校施設更新全体行程シミュレーション	

## 第1章 計画の目的

### 1. 計画の目的

上尾市学校施設更新計画実施計画（以下、「実施計画」という。）は、「上尾市学校施設更新計画基本計画」で定められた学校施設の整備・維持管理等の実行を目的としています。

### 2. 計画の期間

実施計画の計画期間は、令和3年度を開始年度とし、令和7年度までの5年間とします。

### 3. 対象施設

上尾市の保有する小学校（22校）、中学校（11校）を対象とします。  
なお、主に各校の延床面積が100㎡以上の棟を対象に作成します。

### 4. 実施計画の管理

学校施設の更新に係る実施計画の管理は、事務事業を通して遂行されるため、上尾市教育委員会が実施します。

### 5. 進捗状況の評価

上尾市個別施設管理基本計画等評価委員会が実施内容や達成度について総合的な視点から評価します。

### 6. 成果の公表

計画の進捗状況の評価結果については、上尾市教育委員会ホームページ等で公表します。

## 第2章 学校施設更新等実行程表(アクションプラン)

### 1. アクションプランの分類・行程表

アクションプランは、市内の小中学校を「新しい学校づくり優先検討エリア対象校」と「建物更新校」に分類して作成します。


#### (1) 新しい学校づくり優先検討エリア対象校

基本計画では、地区内の児童生徒数の減少の動向や、新たな学校環境に合わせた学校規模等を考慮し、各学校の整備方針を明らかにし、市内5つのエリアを『新しい学校づくり優先検討エリア』として設定しました。

新しい学校づくり優先検討エリア対象校のアクションプランでは、エリア単位で学校施設の更新・維持保全等を検討します。

新しい学校づくり優先検討エリア対象校の行程表は、図表 2-2 のとおりです。

図表 2-1 新しい学校づくり優先検討エリア

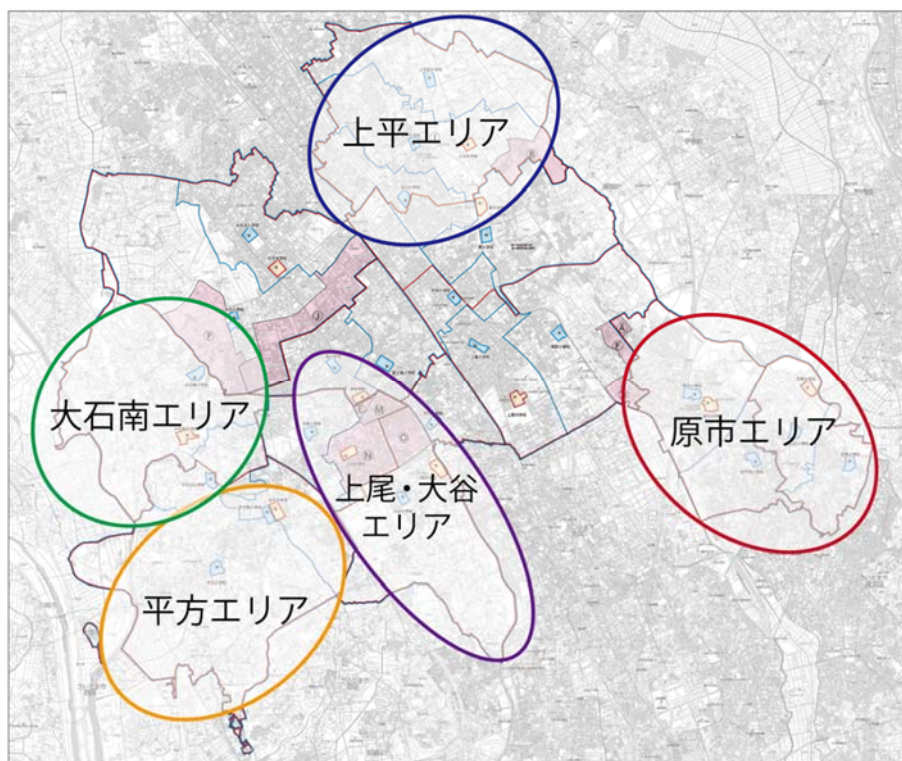

優先検討エリア	対象校
平方エリア	太平中学校、平方東小学校、平方北小学校、平方小学校
原市エリア	原市中学校、原市小学校、瓦葺中学校、尾山台小学校、原市南小学校、瓦葺小学校
大石南エリア	大石中学校、大石南中学校、大石南小学校、大石小学校
上平エリア	上平小学校、上平北小学校
上尾・大谷エリア	富士見小学校、鴨川小学校、南中学校、大谷中学校

出典：上尾市学校施設更新計画基本計画

図表 2-2 新しい学校づくり優先検討エリア対象校の行程内容

行程	内容
検討～判断 (ステップ1)	・当該エリアでの新しい学校づくりの進め方について検討する期間として設定します。新しい学校づくりの実施に係る進め方の提案と当該エリアにおける課題と解決策を検討する期間として設定します。 (統合・学区再編の検討、エリアでの方針を協議)
検討～判断 (ステップ2)	・ステップ1で協議した方針をもとに、新しい学校づくりの実施方法(維持・統合・建設予定地等)について検討・協議する期間として設定します。
検討～判断 (ステップ3)	・ステップ2で協議した実施方法について、新しい学校づくりに向けた具体的な課題や解決策を抽出・検討・協議する期間として設定します。
検討～判断 (ステップ4)	・ステップ3を踏まえ、新しい学校の基本計画を検討し、策定する期間として設定します。 ・新しい学校づくりに向けた準備及び企画・調整の段階として、整備や運営手法の検討や、市場調査、関係者協議の実施のほか、説明会やワークショップ等を開催するなどし、事業構想から事業計画などを含めた基本計画案をまとめ上げる期間です。
実施	・ステップ1～4の検討を踏まえ、新しい学校づくりを進めていく期間として設定します。

(2) 建物更新校

新しい学校づくり優先検討エリアに含まれない学校については、個別の学校ごとにアクションプランを作成します。

建物更新校の行程表は、図表 2-3 のとおりです。

建物更新校
上尾中学校、東中学校、上尾小学校、中央小学校、東町小学校、東小学校、芝川小学校、今泉小学校、大石北小学校、上平中学校、西中学校、西小学校、大谷小学校

出典：上尾市学校施設更新計画基本計画

図表 2-3 建物更新校の行程内容

行程	内容
更新検討～判断	・建物更新校の基本計画を検討し、策定する期間として設定します。 ・校舎の更新に向けた準備及び企画・調整の段階として、整備や運営手法の検討や、市場調査、関係者協議の実施のほか、施設の建替え等の際には、説明会やワークショップ等を開催するなどし、事業構想から事業計画を含めた基本計画案をまとめ上げる期間として設定します。
実施	・校舎の更新等を実施する目標時期を示します。

## 2. 各学校におけるアクションプラン

基本計画の計画期間である 35 年間のうち、5 年間で実施する具体的な取組を 6 ページ以降に示します。

また、校舎単位の具体的な取組に対する内容は、図表 2-4 のとおりです。

なお、社会情勢や財政状況を考慮し、改修設計、改修工事については、コンクリート強度・中性化予測深度の状況等をふまえて実施時期を判断し、全体の平準化を目指します。

図表 2-4 校舎単位の取組内容

取組	内容
基本設計・実施設計	・校舎の建替えに当たっての建物設計期間として設定します。間取りや設備の検討を行い工事発注図面の作成を行います。
建築工事	・校舎の建替えに当たっての建築工事期間として設定します。
改修検討～判断	・既存校舎の長寿命化改修等の検討、判断をする期間として設定します。建物の劣化状況の確認と改修概要や工事期間を検討します。
改修設計	・校舎の長寿命化改修等に当たっての設計期間として設定します。具体的な改修仕様を検討し、工事発注図面の作成を行います。
長寿命化改修工事	・校舎の長寿命化改修等工事の実施期間として設定します。
機能移転等検討	・校舎等の機能移転・複合化を検討する期間として設定します。建物耐用年が到来する建物の機能を他の校舎等に移転させる検討を行います。その他、学校施設への複合化機能がある場合の検討期間として設定します。
機能移転・解体	・校舎等の機能移転及び解体の期間として設定します。機能移転の移転設計と移転工事を行います。また、建物耐用年が、到来している場合は、建物解体を行います。
複合化改修	・既存校舎への複合化改修工事の期間として設定します。
維持・保全	・校舎の維持・保全を基本とし、躯体や設備の状況に応じて、適宜、改修・修繕等を検討・実施する期間として設定します。

図表 2-5 新しい学校づくり優先検討エリア対象校のアクションプランの見方

		年度	2021	2022	2023	2024	2025	
再編校 1 協議	新しい学校づくり優先検討エリア対象校のアクションプラン		新しい学校づくり優先検討エリア対象校の行程を矢羽で表示します。					
	〇〇中学校	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
		〇〇校舎東	20〇〇年	校舎単位の取組名を入れた矢羽を表示します。				
		〇〇校舎西	20〇〇年					
		体育館	20〇〇年					
		【建設】〇〇校舎	-					
	〇〇小学校	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
		特別教室・体育館	20〇〇年	校舎単位の取組名を入れた矢羽を表示します。				
		〇〇校舎西	20〇〇年					
		〇〇校舎	20〇〇年					
		給食室	20〇〇年					
	〇〇小学校	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
		管理・南校舎	20〇〇年	校舎単位の取組名を入れた矢羽を表示します。				
		給食室	20〇〇年					
		体育館	20〇〇年					
北校舎		20〇〇年						

図表 2-6 建物更新校のアクションプランの見方

		年度	2021	2022	2023	2024	2025
1 〇〇〇学校	建物更新校のアクションプラン		建物更新校の行程を矢羽で表示します。				
	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
	〇〇校舎	20〇〇年	校舎単位の取組名を入れた矢羽を表示します。				
	〇〇校舎西	20〇〇年					
	体育館	20〇〇年					
	給食室	20〇〇年					
	【建設】〇〇校舎	-					

【新しい学校づくり優先検討エリア対象校】

		年度	2021	2022	2023	2024	2025
再編校 1 協議	新しい学校づくり優先検討エリア対象校のアクションプラン		検討～判断 (ステップ1)		検討～判断 (ステップ2)	検討～判断 (ステップ3)	検討～判断 (ステップ4)
<b>太平中学校</b> 学校の方向性：【2024年度末まで】 小中一貫一体校の設置協議 (太平中学校・平方東小学校敷地)	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
	管理・南校舎東	2029	維持・保全				
	北校舎	2034					
	南校舎西	2041					
	渡り廊下	2034	維持・保全				
	格技場	2043					
	給食室	2052					
	プール (付属屋・プール槽)	-					
	体育館	2025	更新検討～判断	維持・保全			
【建設】体育館	-	更新検討～判断	基本設計	実施設計	建築工事		
<b>平方東小学校</b> 学校の方向性：【2024年度末まで】 平方小学校との学校再編協議 平方北小学校との学校再編協議 小中一貫一体校の設置協議 (太平中学校・平方東小学校敷地)	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
	特別教室・体育館	2029	維持・保全				
	北校舎西	2034					
	管理・南校舎	2034					
	北校舎東	2035					
	給食室	2035					
	プール (付属屋・プール槽)	-					
<b>平方小学校</b> 学校の方向性：【2024年度末まで】 平方東小学校との学校再編協議 小中一貫一体校の設置協議 (太平中学校・平方東小学校敷地)	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
	管理・南校舎	2029	維持・保全				
	給食室	2029					
	体育館	2031					
	北校舎	2037					
	プール (付属屋・プール槽)	-					
<b>平方北小学校</b> 学校の方向性：【2024年度末まで】 平方東小学校との学校再編協議 小中一貫一体校の設置協議 (太平中学校・平方東小学校敷地)	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
	北校舎	2036	維持・保全				
	給食室	2036					
	管理・南校舎	2036					
	体育館	2031					
	プール (付属屋・プール槽)	-					



		年度	2021	2022	2023	2024	2025
<b>再編校 2 協議</b>		新しい学校づくりの優先検討エリア 対象校のアクションプラン		検討～判断 (ステップ1)	検討～判断 (ステップ2)	検討～判断 (ステップ3)	検討～判断 (ステップ4)
<b>原市中学校</b>	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
	中央校舎東	2026	維持・保全			改修検討～判断	改修設計
	南校舎特別教室	2033	維持・保全				
	金工木工特別教室	2028	維持・保全			機能移転検討	
	管理・中央校舎西	2038	維持・保全				
	格技場	2043	維持・保全				
	美術特別教室	2046	維持・保全			機能移転検討	
	給食室	2038	維持・保全				
	プール管理	2038	維持・保全				
	体育館	2026	維持・保全	更新検討～判断		維持・保全	
【建設】体育館	-		更新検討～判断		基本設計	実施設計	
<b>原市小学校</b>	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
	北校舎	2031	維持・保全				
	普通特別教室棟・学童	2032					
	南校舎・管理・体育館	2031					
	給食室	2036					
	プール (付属屋・プール槽)	-					
<b>再編校 3 協議</b>		新しい学校づくりの優先検討エリア 対象校のアクションプラン		検討～判断 (ステップ1)	検討～判断 (ステップ2)	検討～判断 (ステップ3)	検討～判断 (ステップ4)
<b>原市南小学校</b>	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
	L型校舎	2034	維持・保全				
	管理・体育館	2029					
	給食室	2034					
	プール (付属屋・プール槽)	-					
<b>尾山台小学校</b>	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
	管理・北校舎	2026	維持・保全				
	給食室	2026					
	南校舎	2029					
	体育館	2029					
プール (付属屋・プール槽)	-						
<b>瓦葺小学校</b>	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
	北校舎	2035	維持・保全				
	給食室	2035	維持・保全				
	管理・特別教室・体育館	2030	維持・保全			改修検討～判断	
	プール (付属屋・プール槽)	-	維持・保全				

		年度	2021	2022	2023	2024	2025				
<b>再編校 4 協議</b>		新しい学校づくり優先検討エリア 対象校のアクションプラン		検討～判断 (ステップ1)		検討～判断 (ステップ2)		検討～判断 (ステップ3)		検討～判断 (ステップ4)	
<b>大石中学校</b>	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組								
	管理・中央校舎東	2028	維持・保全	改修検討～判断	改修設計	長寿命化改修	維持・保全				
	中央校舎西	2033									
	北校舎特別教室	2041									
	南校舎	2053									
	体育館	2026	維持・保全	改修検討～判断	改修設計	維持・保全	長寿命化改修				
	給食室	2052									
	格技場	2047									
	部室	2045									
プール (付属屋・プール槽)	-										
<b>大石南中学校</b>	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組								
	管理・北校舎	2036									
	東校舎	2036									
	南校舎東	2037									
	南校舎西	2041									
	体育館	2031									
	格技場	2045									
	給食室	2036									
	プール (付属屋・プール槽)	-									
<b>再編校 5 協議</b>		新しい学校づくり優先検討エリア 対象校のアクションプラン		検討～判断 (ステップ1)		検討～判断 (ステップ2)		検討～判断 (ステップ3)		検討～判断 (ステップ4)	
<b>大石小学校</b>	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組								
	管理・南校舎	2029			維持・保全	長寿命化改修	維持・保全				
	北校舎	2031	改修検討～判断	改修設計	長寿命化改修	維持・保全					
	体育館	2030									
	給食室	2059									
	プール (付属屋・プール槽)	-									
<b>大石南小学校</b>	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組								
	管理・特別教室・体育館	2028									
	北校舎	2033									
	給食室	2033									
	南校舎	2033									
プール (付属屋・プール槽)	-										

		年度	2021	2022	2023	2024	2025
<b>再編校 6 協議</b>		新しい学校づくり優先検討エリア 対象校のアクションプラン			検討～判断 (ステップ1)		検討～判断 (ステップ2)
<b>上平小学校</b>  学校の方向性：【2026年度末まで】 上平北小学校との学校再編協議	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
	北校舎	2025	維持・保全	改修検討～判断	改修設計	長寿命化改修	
	体育館	2030					
	管理・南校舎	2039	維持・保全				
	中央校舎便所	2039	維持・保全	改修検討～判断	改修設計	長寿命化改修	
	給食室	2039					
プール (付属屋・プール槽)	-	維持・保全					
<b>上平北小学校</b>  学校の方向性：【2026年度末まで】 上平小学校との学校再編協議	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
	管理・中央校舎	2038					
	給食室	2038					
	体育館	2033					
	プール (付属屋・プール槽)	-					
		年度	2021	2022	2023	2024	2025
<b>再編校 7 協議</b>		新しい学校づくり優先検討エリア 対象校のアクションプラン			検討～判断 (ステップ1)		検討～判断 (ステップ2)
<b>富士見小学校</b>  学校の方向性：【2026年度末まで】 鴨川小学校との学校再編協議	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
	北校舎	2071					
	管理・南校舎	2071					
	給食室	2071	維持・保全				
	図書メディア	2066					
	プール体育館	2071					
<b>鴨川小学校</b>  学校の方向性：【2026年度末まで】 富士見小学校との学校再編協議	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
	管理・体育館	2029					
	南校舎	2034					
	給食室	2034	維持・保全				
	北校舎	2044					
プール (付属屋・プール槽)	-						

		年度	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>再編校 8 協議</b>		新しい学校づくり優先検討エリア 対象校のアクションプラン				検討～判断 (ステップ1)	検討～判断 (ステップ2)		
<b>大谷中学校</b>  学校の方向性：【2026年度末まで】 南中学校との学校再編協議	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組						
	管理・校舎	2044	維持・保全	改修検討～判断	改修設計	長寿命化改修			
	プール・体育館	2044					維持・保全		
	部室	2044	維持・保全	改修検討～判断	改修設計	長寿命化改修			
	格技場	2046					維持・保全		
	給食室	2044	維持・保全	改修検討～判断	改修設計	維持・保全			
<b>南中学校</b>  学校の方向性：【2026年度末まで】 大谷中学校との学校再編協議	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組						
	管理・中央校舎	2038	維持・保全						
	体育館	2033							
	給食室	2048							
	格技場	2045							
	プール (付属屋・プール槽)	-							
<b>指定校変更+中学校配置変更協議</b>		新しい学校づくり優先検討エリア 対象校のアクションプラン				検討～判断 (ステップ1)	検討～判断 (ステップ2)	検討～判断 (ステップ3)	検討～判断 (ステップ4)
<b>瓦葺中学校</b>  学校の方向性：【2024年度末まで】 新設中学校設置協議 (尾山台小学校敷地)	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組						
	管理・中央校舎	2036	維持・保全						
	金工木工特別教室	2031							
	体育館	2031							
	格技場	2045							
	美術特別教室	2037							
	給食室	2036							
	プール (付属屋・プール槽)	-							

【建物更新校】

		年度	2021	2022	2023	2024	2025	
1	上尾中学校	建物更新校のアクションプラン	更新検討～判断				実施	
		校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
		管理・南校舎	2075	維持・保全				
		北校舎西	2026					
		北校舎東	2041					
		プール格技	2076					
		体育館	2075					
		給食室	2075					
		【建設】臨時校舎（被服室）						
2	東中学校	建物更新校のアクションプラン						
		校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
		管理・南校舎	2035	維持・保全				
		東校舎	2035					
		金工木工特別教室	2030					
		北校舎	2040					
		体育館	2030	維持・保全			改修検討～判断	改修設計
		格技場	2046	維持・保全				
		給食室	2035					
プール（付属屋・プール槽）	-							
3	上尾小学校	建物更新校のアクションプラン						
		校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
		北校舎	2028	維持・保全				
		体育館	2025					
		南校舎	2031	維持・保全	改修検討～判断	改修設計	長寿命化改修	維持・保全
		給食室	2033	維持・保全				
		管理・特別教室	2037					
		プール（付属屋・プール槽）	-	維持・保全			維持・保全	長寿命化改修

		年度	2021	2022	2023	2024	2025	
4	中央小学校	建物更新校のアクションプラン						
		校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
		北校舎	2026	維持・保全			改修検討～判断	改修設計
		東校舎	2032					
		体育館	2029					
		給食室	2044					
		管理・南校舎	2073	維持・保全				
		プール（付属屋・プール槽）	-					
5	東町小学校	建物更新校のアクションプラン					更新検討～判断	
		校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
		管理・中央校舎	2036	維持・保全				
		給食室	2036					
		体育館	2031	維持・保全				改修検討～判断
		東校舎	2045	複合化改修	維持・保全			
		プール（付属屋・プール槽）	-	維持・保全				
		6	東小学校	建物更新校のアクションプラン				
校舎名	目標耐用年数 到来年度			校舎単位の取組				
管理・南校舎	2029			維持・保全	改修検討～判断	改修設計	長寿命化改修	維持・保全
北校舎	2034			維持・保全				
体育館	2030			維持・保全				改修検討～判断
給食室	2029			維持・保全				
プール（付属屋・プール槽）	-			維持・保全				
7	大石北小学校			建物更新校のアクションプラン				
		校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
		管理・中央校舎	2037	維持・保全			改修検討～判断	改修設計
		給食室	2038					
		体育館	2033					
		北校舎	2037					
		西校舎	2049	維持・保全				
		東校舎	2043					
プール（付属屋・プール槽）	-	維持・保全						



		年度	2021	2022	2023	2024	2025
11 西小学校	建物更新校のアクションプラン						
	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
	管理・特別教室	2035	維持・保全	改修検討～判断	改修設計	長寿命化改修	維持・保全
	南校舎	2035					
	体育館	2030					
	給食室	2035					
	プール（付属屋・プール槽）	-	維持・保全				
12 今泉小学校	建物更新校のアクションプラン						更新検討～判断
	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
	管理・特別教室	2035	維持・保全				改修検討～判断
	給食室	2035					
	南校舎	2035					
	体育館	2030	維持・保全				
	プール（付属屋・プール槽）	-					
13 大谷小学校	建物更新校のアクションプラン						
	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位の取組				
	北校舎	2032	維持・保全	改修検討～判断	改修設計	長寿命化改修	維持・保全
	体育館	2031	維持・保全			改修検討～判断	改修設計
	管理・中央校舎	2038					
	給食室	2038	維持・保全				
	東校舎①	2047					
	東校舎②	2047	機能移転・解体				
	プール（付属屋・プール槽）	-	維持・保全				



【巻末資料①】 既存学校施設の目標耐用年数

各学校において直近に目標耐用年数を迎える校舎等と体育館を以下に整理します。

図表 1 学校ごとの耐用年数

地区	学校名	直近に耐用年数を迎える棟	目標耐用年 到来年度
上尾	上尾中学校	北校舎西	2026年
	東中学校	金工木工特別教室	2030年
		体育館	2030年
	上尾小学校	体育館	2025年
		北校舎	2028年
		南校舎	2031年
	中央小学校	北校舎	2026年
		体育館	2029年
		東校舎	2032年
	東町小学校	体育館	2031年
管理・中央校舎、給食室		2036年	
東小学校	管理・南校舎、給食室	2029年	
	体育館	2030年	
富士見小学校	図書メディア	2066年	
平方	太平中学校	体育館	2025年
		南校舎東棟	2029年
	平方東小学校	特別教室・体育館棟	2029年
	平方北小学校	体育館	2031年
		管理・南校舎、北校舎	2036年
平方小学校	管理・南校舎、給食室	2029年	
	体育館	2031年	
原市	原市中学校	中央校舎東	2026年
		体育館	2026年
		金工木工特別教室	2028年
	原市小学校	北校舎、管理・体育館	2031年
		南校舎	2032年
	瓦葺中学校	金工木工特別教室、体育館	2031年
	尾山台小学校	管理・北校舎、給食室	2026年
		南校舎、体育館	2029年
原市南小学校	管理・体育館棟	2029年	
瓦葺小学校	管理・特別教室・体育館	2030年	

※各校の100㎡以上の校舎等と体育館（倉庫等を除く）を対象に整理しています。

地区	学校名	直近に耐用年数を迎える棟	目標耐用年 到来年度
大石	大石中学校	体育館	2026年
		管理・中央校舎東	2028年
	大石南中学校	体育館	2031年
		管理・北校舎、東校舎、給食室	2036年
	大石南小学校	管理・特別教室・体育館	2028年
		北校舎、給食室、南校舎	2033年
	大石小学校	管理・南校舎	2029年
		体育館	2030年
北校舎		2031年	
大石北小学校	体育館	2033年	
	管理・中央校舎、北校舎	2037年	
上平	上平中学校	体育館	2023年
		北校舎西	2024年
		北校舎東	2032年
	上平小学校	北校舎	2025年
		体育館	2030年
	上平北小学校	体育館	2033年
管理・中央校舎、給食室		2038年	
芝川小学校	特別教室・体育館	2030年	
大谷	西中学校	金工木工特別教室	2026年
		体育館	2027年
		管理・北校舎	2031年
	南中学校	体育館	2033年
		管理・中央校舎	2038年
	大谷中学校	校舎すべて	2044年
	西小学校	体育館	2030年
		管理・特別教室、給食室、南校舎	2035年
	今泉小学校	体育館	2030年
		管理・特別教室、給食室、南校舎	2035年
鴨川小学校	管理・体育館	2029年	
大谷小学校	体育館	2031年	
	北校舎	2032年	

※各校の100㎡以上の校舎等と体育館（倉庫等を除く）を対象に整理しています。



ページ調整



## 上尾市学校施設更新計画実施計画

令和3年 月

上尾市教育委員会教育総務部教育総務課

〒362-8501 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号

電話:048-775-5111(代表) FAX:048-776-2250
